



Svazek obcí

MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA

Leskovec nad Moravicí 204, 793 68 Dvorce, tel. 728 282 567, e-mail kamila.sochova@atlas.cz

Vážený pan náměstek Moravskoslezského kraje  
Jan Krkoška  
Krajský úřad Moravskoslezského Kraje  
28. října 117  
702 18 Ostrava

V Leskovci nad Moravicí dne 7. 11. 2017

**Věc: Žádost o prodloužení termínu realizace projektu „Pořízení velkokapacitní lodě“ pro Slezskou Hartu**

Vážený pane náměstku, Mikroregion Slezská Harta, sdružení 14 obcí kolem vodní nádrže Slezská Harta v okrese Bruntál, obdrželo rozhodnutím zastupitelstva kraje usnesením č.2/72 ze dne 22. 12. 2016, dotaci na projekt „Pořízení velkokapacitní lodě“ ve výši 14 mil. Kč. Dle smlouvy o poskytnutí dotace č. 00264/2017/RRC ze dne 3. 2. 2017 má projekt dosáhnout svého stanoveného účelu, tedy být zrealizován, do **31. 12. 2017**.

Přípravy tohoto projektu jsou ale natolik náročné a to jak po stránce technické, tak časové, že nebude možné tento projekt zdárně dokončit do výše uvedeného termínu, tedy do 31. 12. 2017.

V rámci přípravy došlo k těmto objektivním příčinám, které zásadně ovlivnily harmonogram realizace projektu.

- Dne 1. 12. 2016 muselo být vyhlášeno nové, již **2. kolo výběrového řízení** (v 1. kole se nepřihlásil žádný z uchazečů – důvodem byla krátká doba na realizaci zakázky. Termín dokončení byl na základě požadavku MSK). Výběrové řízení bylo provedeno dle zákona o veřejných zakázkách v co nejkratším možném termínu.
- **Podpis smlouvy s vítězným uchazečem** 2. kola VŘ – 02/2017 ( Im-marine s.r.o.)
- Následně **odstoupení od smlouvy ze strany vyhlášovatele VŘ** (vybraná firma neplnila své závazky, probíhala nedostatečná komunikace, celkově postupné kroky nevedly k naplnění předmětu zakázky v jejím původním znění – 03/2017
- Dne 11. 4. 2017 následně vyhlášeno **3. kolo výběrového řízení** (dle zákona o VZ opět v nejkratším možném termínu)
- 6. 6. 2017 podaná námitka v pořadí 2. uchazeče VŘ – (námitka nesplnila ani náležitosti dle § 244 Zákona – byla zamítnuta; 10 dní zpoždění v harmonogramu VŘ)
- Dne **11. 7. 2017 uzavřena smlouva s vítěznou firmou "ATUT" s.c**



Svazek obcí

**MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA**

Leskovec nad Moravicí 204, 793 68 Dvorce, tel. 728 282 567, e-mail kamila.sochova@atlas.cz

*Nyní se projekt nachází ve fázi schvalování dokumentace CS Loydem (nejvyšší certifikační autoritou) a přípravou materiálu pro konstrukci plavidla. Schválení dokumentace CS Loydem očekáváme během několika následujících dní. K dispozici také máme kompletní dokumentaci, včetně rozsáhlé elektrodokumentace.*

**Z výše uvedeného důvodu Vás tedy žádá Mikroregion Slezská Harta o prodloužení termínu realizace projektu „Pořízení velkokapacitní lodě“ pro Slezskou Hartu, a to do 31. 10. 2018.**

Děkujeme za kladné vyřízení naší žádostí. Pevně věříme, že termín dokončení projektu bude co nejrychlejší, abychom stihli část letní sezóny 2018.

**Příloha:**

Hlavní schematický plán lodi pro Slezskou Hartu

S pozdravem


.....  
Ing. Libor Unverdorben  
předseda Mikroregionu Slezská Harta

**MIKROREGION  
SLEZSKÁ HARTA**  
IČ: 711 93 821 -3-  
Leskovec nad Moravicí 204  
793 68 DVORCE

Powierzchnia solarów:

- dach górny - 41,44m<sup>2</sup>
- skosy nadbudówki - 20,67 m<sup>2</sup>
- dach sterówki - 6,90 m<sup>2</sup>
- razem: - 69 m<sup>2</sup>

- 80 pec x 1,082x0,796 = ca. 69 m<sup>2</sup>

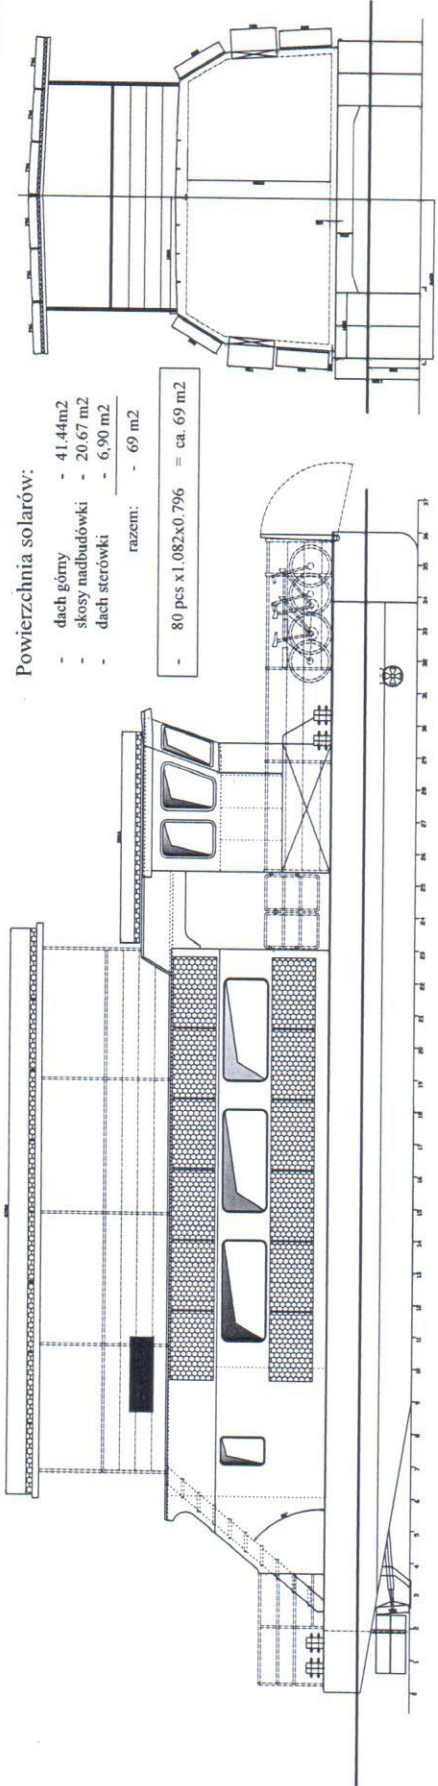

WYMIARY GŁÓWNE:


- dlugość całkowita Lc = 18,00 m
- szerokość całkowita Bc = 5,00 m
- szerokość Bk = 4,90 m
- wysokość Hk = 1,30 m
- zanurzenie T = 0,80 m

DANE PODSTAWOWE:


- v = 14 km/h
- miejsca siedzące 45+2
- napęd: 2x 35 kW, 2 śruby Ø500

# KONCEPCJA 2

pokład główny - 32 miejsca siedzące

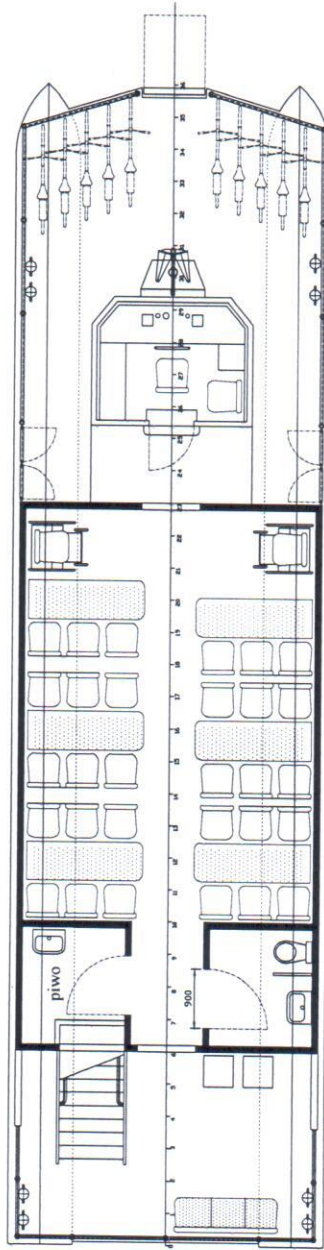

pokład górny - 16 miejsca siedzące

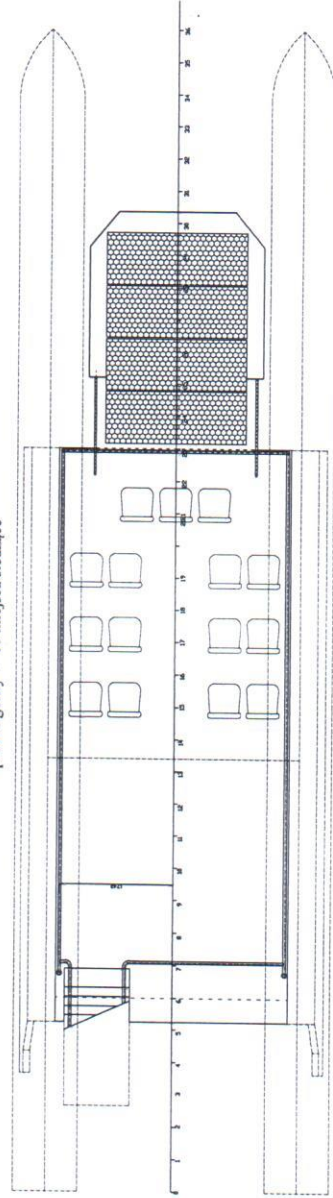

Praca autorstwa inżyniera Wojciecha Górnika, wykonana i rozpoznawana w biurze P.W. 'ATUT' - Warszawa

P.W. 'ATUT' S.C.  
Stocznia Januszkowice

statek pasażerski - kabinowy

PLAN OGÓLNY

Format:

Skala: 1:50  
Data: 20.08.2017  
Dl. by: S. Dufowski

Projekt No: 469-PT  
Dl. No: 011-00

Stron: 1  
Strona nr: 1
